Gestion hydraulique - BARRAGE DU SALAGOU
Cote normale d'exploitation : 139 m NGF

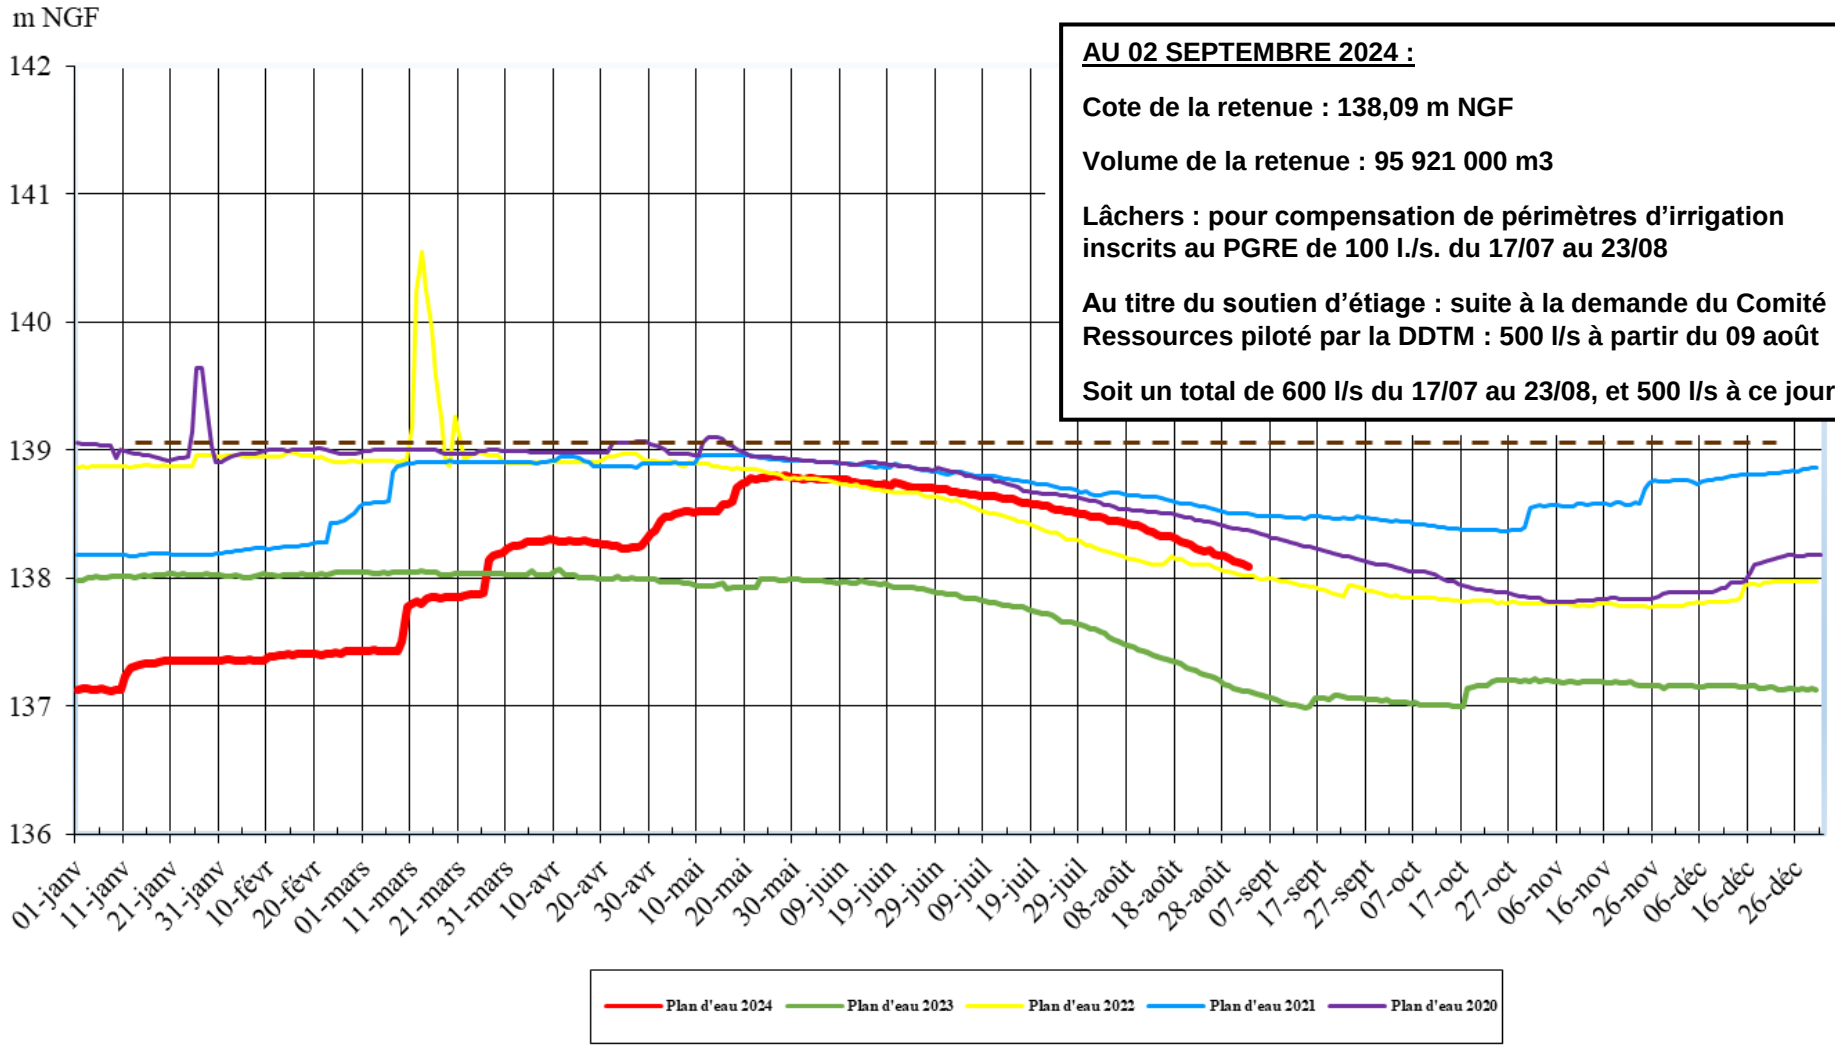

AU 02 SEPTEMBRE 2024 :

Cote de la retenue : 138,09 m NGF

Volume de la retenue : 95 921 000 m3

Lâchers : pour compensation de périmètres d'irrigation inscrits au PGRE de 100 l./s. du 17/07 au 23/08

Au titre du soutien d'étiage : suite à la demande du Comité Ressources piloté par la DDTM : 500 l/s à partir du 09 août

Soit un total de 600 l/s du 17/07 au 23/08, et 500 l/s à ce jour
